COSTRUZIONE 9 ALLOGGI ERP - COMUNE DI CECINA - LOCALITA' VIA AURELIA SUD - FOSSO D'ORO - PIANO DELLA SICUREZZA - ALLEGATO 3 - DIAGRAMMA DI GANTT
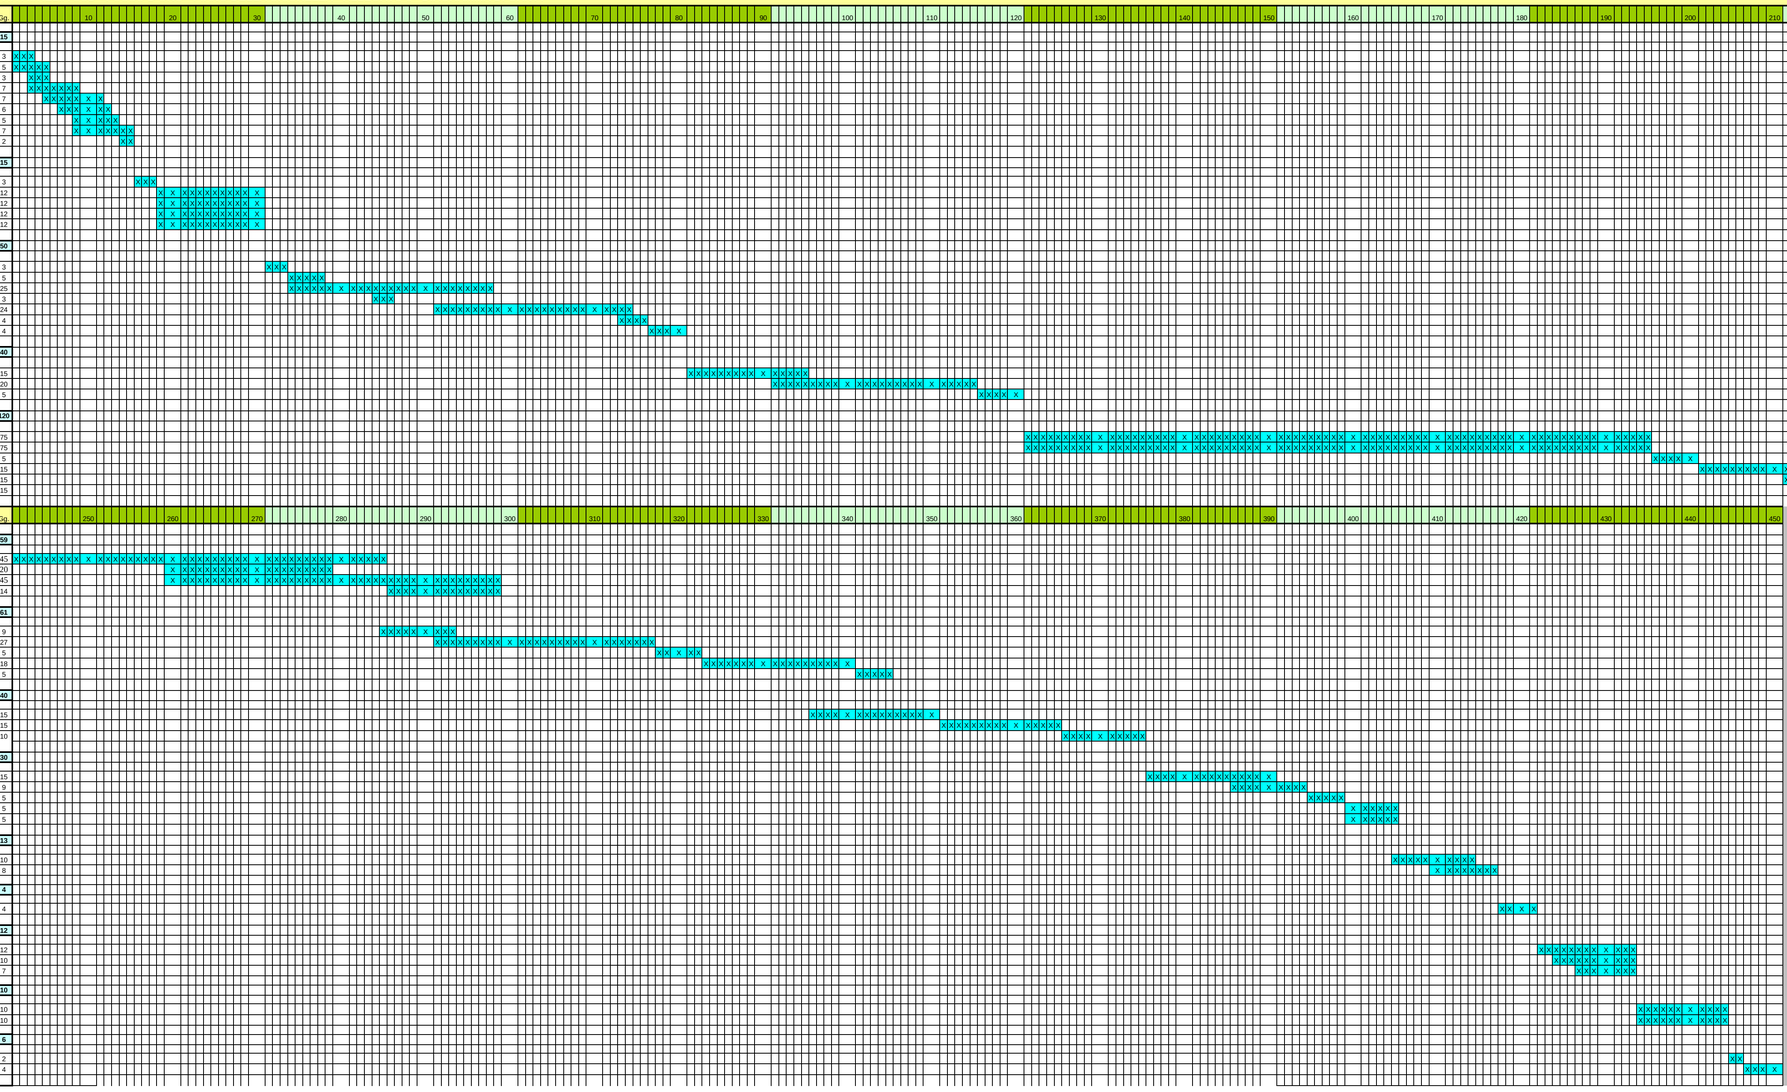
ID	LAVORAZIONI	Gg.
A	**FASE ALLESTIMENTO CANTIERE**	**15**
1	Ricerca impianti e tubazioni.	3
2	Recinzione e cartellonistica.	5
3	Servizi igienici assistenziali di cantiere.	3
4	Viabilità interna di cantiere.	7
5	Montaggio delle baracche, degli uffici.	7
6	Impianto elettrico e messa a terra.	6
7	Impianto idrico.	5
8	Installazione delle altre attrezzature.	7
9	Allestimento aree di stoccaggio materiali.	2
B	**FASE TRACCIAMENTO E SCAVO**	**15**
10	Tracciamento e delimitazione della zona dello scavo.	3
11	Scavo o splateamento con pala meccanica.	12
12	Stoccaggio temporaneo terra di risulta (temporaneo).	12
13	Trasporto di terra di risulta alla discarica.	12
14	Aggottamento e scarico delle acque reflue.	12
C	**FASE FONDAZIONI E GRU A TORRE**	**50**
15	Getto magrone edifici e gru	3
16	Casseratura, carpenteria in ferro, getto cls e disarmo della fondazione della gru.	5
17	Casseratura, carpenteria in ferro, getto cls e disarmo delle fondazioni edifici	25
18	Montaggio delle gru a torre.	3
19	Casseratura, carpenteria in ferro, getto cls e disarmo muri in elevazione edifici	24
20	Impermeabilizzazioni muri controterra	4
21	Protezzione muri controterra e rinterro	4
D	**STRUTTURE IN ELEVAZIONE INTERR. E SOLAIO 1°IMPALC ATO**	**40**
22	Casseratura, carpenteria in ferro, getto e disarmo dei pilastri, dei setti e delle scale del piano inter.to.	15
23	Armatura, casseratura travi e montaggio del solaio del piano terra.	20
24	Getto solaio e travi e disarmo.	5
E	**STRUTTURE IN ELEVAZIONE E COPERTURE**	**120**
25	Montaggio ponteggi.	75
26	Casseratura, carpenteria in ferro, getto e disarmo di scale, pilastri, solai e travi	75
27	Montaggio ponteggio.	5
28	Casseratura, armatura in ferro, getto e disarmo del solai di copertura.	15
29	Murature portanti, tavelloni e massetti armati in copertura	15
30	Isolamento termico e montaggio copeertura metallica	15
F	**TAMPONAMENTI ESTERNI, ISOLAMENTI, TAMPONAMENTI INTERNI, DIVISORI E TRAMEZZATURE.**	**59**
31	Tamponamenti muri esterni ed isolamentia cappotto	45
32	Divisori alloggi e vano scale con isolamenti acustici verticali	20
33	Tamponamenti interni, divisori e tramezzature.	45
34	Soglie e davanzali, controteali porte e finestre.	14
G	**TRACCE IMPIANTI e POSA IMPIANTI e MASSETTI**	**61**
35	Tracce per impianti: elettrici, telefonici, TV, idraulici (adduzioni e scarichi), termici, gas.	9
36	Posa e muratura d'impianti: elettrici, telefonici, TV, idraulici (adduzioni e scarichi), gas.	27
37	Massetti impianti	5
38	Posa tappeto acustico e impianto radiante.	18
39	Massetti impianto radiante.	5
H	**INTONACI ESTERNI ED INTERNI, POSA SOGLIE PORTE E FINESTRE**	**40**
40	Intonaci esterni.	15
41	Intonaci interni.	15
42	Posa infissi interni, esterni e portoncini	10
I	**TINTEGGIATURE ESTERNE, INTERNE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, SANITARI E INFISSI**	**30**
43	Tinteggiature interne 1° e 2° mano.	15
44	Rivestimenti a parete.	9
45	Montaggio pavimenti e scale.	5
46	Montaggio sanitari.	5
47	Montaggio ringhiere, porte e finestre e accessori.balconi	5
L	**GRUPPI TERMICI E ACCESSORI IMPIANTI**	**13**
48	Gruppi termici e rifiniture accessori impianti e pannelli coperture	10
49	Rifiniture impianti: linee e accessori.e tinteggiature	8
M	**SMONTAGGIO PONTEGGI**	**4**
50	Smontaggio ponteggi.	4
N	**POZZETTI, CANALIZZAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI, SISTEMAZIONI A VERDE**	**12**
51	Pozzetti, canalizzazioni e allacciamenti.	12
52	Impermeabilizzazioni e massetti:	10
53	Impianto di irrigazione, sistemazioni a verde e posa alberature.	7
O	**POSA PAVIMENTAZIONI ESTERNE**	**10**
54	Pavimentazioni carrabili e pedonali	10
55	Altre finiture esterne	10
P	**SMONTAGGIO GRU, ATTREZZATURE DI CANTIERE E PULIZIA FINALE**	**6**
56	Smontaggio gru.	2
57	Smontaggio servizi, attrezzature, cartellonistica, recinzioni e pulizia.	4
